


Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

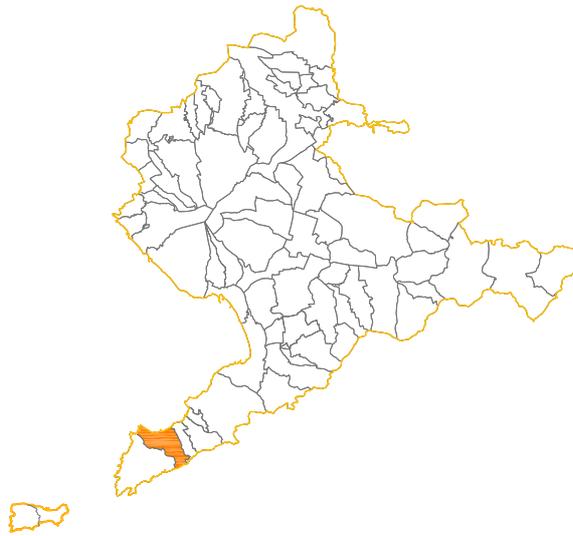

Comune di Sorrento
Manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di emergenza a servizio del sollevamento fognario Marina di Puolo

ags
AceaGori Servizi
 Gruppo Acea

INGEGNERIA
 Il Responsabile
 ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

DATA

2211

Elaborato:
 TS.02

Scala:

PROGETTO ESECUTIVO
 Aggiornato sulla base delle prescrizioni della Regione Campania - Settore U.O.D.
 Valutazioni Ambientali - prot. 548674 del 09.08.2016

Titolo:
ALLEGATO "A"
Diagramma di Gantt

Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Dicembre 2016	X	X	X

DIRETTORE TECNICO
 ing. Antonio De Cicco

IL R.U.P.

Nome attività	Durata	Mese 1												Mese 2												Mese																																						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Posa condotta a terra	8 g	[Bar chart showing activities for 'Posa condotta a terra' with bars for days 1-11 and 12-27]																																																														
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	[Bar chart showing activity for 'Allestimento di cantiere temporaneo su strada' on day 1]																																																														
Demolizione di strutture in c.a.	1 g	[Bar chart showing activity for 'Demolizione di strutture in c.a.' on day 2]																																																														
Scavo a sezione obbligata	1 g	[Bar chart showing activity for 'Scavo a sezione obbligata' on day 3]																																																														
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1 g	[Bar chart showing activity for 'Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione' on day 4]																																																														
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1 g	[Bar chart showing activity for 'Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.' on day 8]																																																														
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g	[Bar chart showing activity for 'Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.' on days 10-11]																																																														
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	2 g	[Bar chart showing activity for 'Posa di condotta fognaria in materie plastiche' on days 10-11]																																																														
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Bar chart showing activity for 'Smobilizzo del cantiere' on day 11]																																																														
Posa condotta a mare	13 g	[Bar chart showing activities for 'Posa condotta a mare' with bars for days 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27]																																																														
Allestimento cantiere temporaneo a mare	1 g	[Bar chart showing activity for 'Allestimento cantiere temporaneo a mare' on day 12]																																																														
Rimozione condotta sottomarina	2 g	[Bar chart showing activity for 'Rimozione condotta sottomarina' on days 13-14]																																																														
Operazioni di controllo delle opere eseguite, sopralluoghi in mare e posa in opera di segnalamenti marittimi per allestimento/smobilizzo	2 g	[Bar chart showing activity for 'Operazioni di controllo delle opere eseguite, sopralluoghi in mare e posa in opera di segnalamenti marittimi per allestimento/smobilizzo' on days 15-16]																																																														
Carico, trasporto e scarico o posa in opera di materiali con motopontone munito di gru	2 g	[Bar chart showing activity for 'Carico, trasporto e scarico o posa in opera di materiali con motopontone munito di gru' on days 18-19]																																																														
Posa di condotta sottomarina	5 g	[Bar chart showing activity for 'Posa di condotta sottomarina' on days 20-24]																																																														
Smobilizzo cantiere a mare	1 g	[Bar chart showing activity for 'Smobilizzo cantiere a mare' on day 27]																																																														
LEGENDA Zona:																																																																
Z1 = ZONA UNICA																																																																
